



▶ **GESTÃO DE PROJETOS**

Prof.: Cassiano Borim

cassiano.ricardo@unicesumar.edu.br

Aulas 7 e 8

► Nossos **objetivos** com esta aula:

1

Gestão de Requisitos na Gestão de Projetos

1.1

Backlog do Produto

1.2

Visão do Produto

1.3

Gestão do Backlog com priorização

1.4

História do Usuário / US – User Story

cassiano.ricardo@unicesumar.edu.br

► Nossos **objetivos** com esta aula:

1.5 Critérios de Aceite

1.6 Ferramentas: 3W's – 3C's e INVEST

1.7 Tarefa / Task

2 Requisitos em Ambiente Ágil x Ambiente Tradicional

2.1 Manifesto Ágil

cassiano.ricardo@unicesumar.edu.br

► Nossos **objetivos** com esta aula:

2.2 SCRUM

2.2.1 Cerimônias do SCRUM

2.2.1 Cerimônias do SCRUM



**Bora 8º
semestre!!**

cassiano.ricardo@unicesumar.edu.br



Gestão de Requisitos dentro da Gestão de Projetos

1




Backlog do Produto

O backlog do produto é uma lista priorizada de trabalho para a equipe de desenvolvimento, derivado do escopo e seus requisitos.

Os itens mais importantes são mostrados na parte superior do backlog do produto para que a equipe saiba o que entregar primeiro.



Backlog do Produto

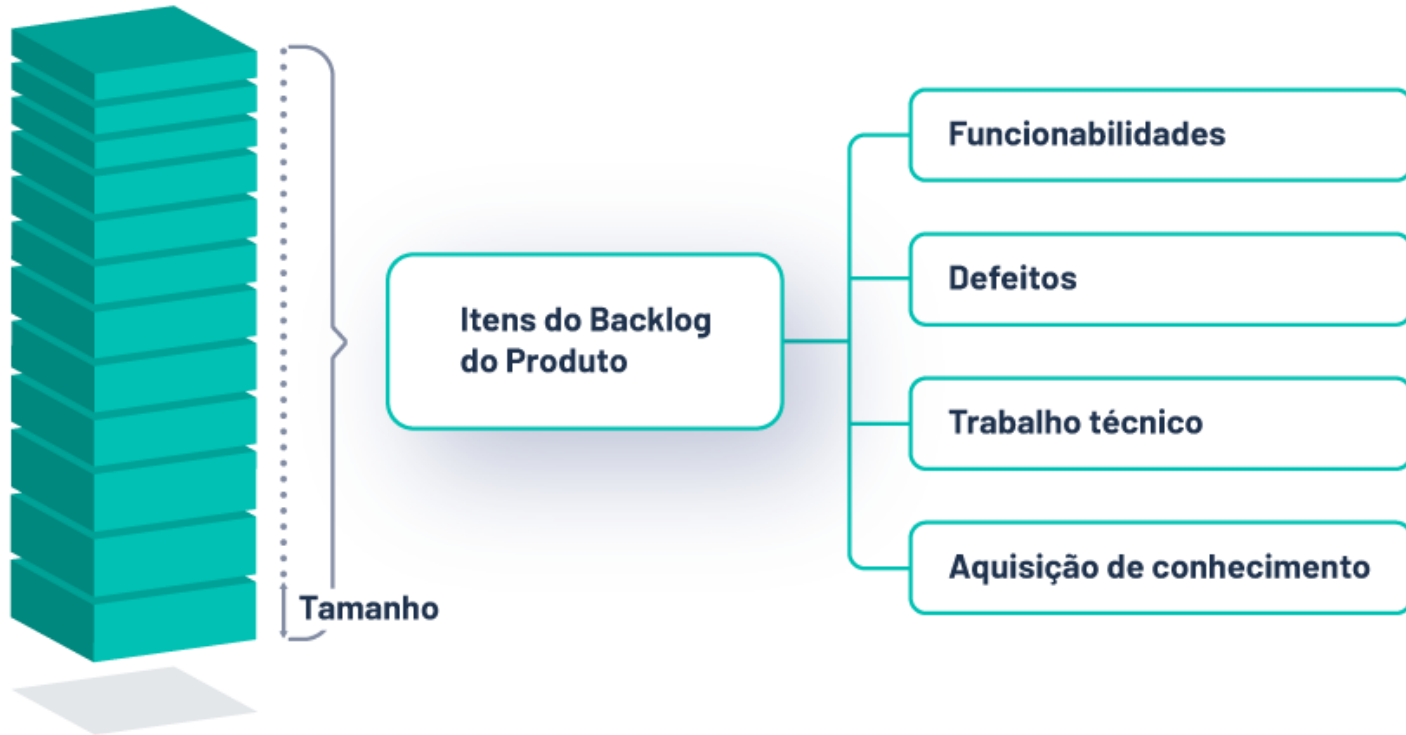

Exemplo de Backlog

ID	NOME	IMPORTÂNCIA	ESTIMATIVA	COMO TESTAR	NOTAS
1	Depósito	30	05	Faça o login, deposite RS10 e cheque seu saldo	Utilize o banco de dados chamado teste 1
2	Extrato Bancário	10	08	Faça o login, clique em extrato e faça o filtro.	Utilize a conta de usuário teste

Product Backlog

 Nova História

 Mapa de Impacto Pontos: **51/2**
Em Desenv.: **5**


#	?	Módulo	História	Sprint	Situação	P	T		
H18	Não		Melhorias no Desktop	1	Pronta		P		
H19	Não	Faturamento	Definição de preços de venda	1	Pronta		P		
H21	Não		Consulta Pedidos vendidos por cliente	0	Iniciada	2	P		
H27	Sim	Faturamento	Operações de saída	0	Iniciada	3	M		
H20	Sim	Faturamento	Condição de pagamento	1	Iniciada		P		
H33	Sim		Código de digitação nota fiscal	0	Aguardando	0	M		
H34	Não		Consulta Pedido/NF	0	Aguardando	1	P		
H22	Sim		Correções no Sistema	1	Aguardando		P		
H23	Não		Cadastro sobre produtos	1	Aguardando		M		
H24	Não		Cadastro de clientes	1	Aguardando		G		

▼ Backlog (665 issues)

0 0 0

Create sprint

- | | | | |
|---|---|---------|---|
| EX-1 As a user, I want a sleek and intuitive user interface | ≡ | TO DO ▼ | 👤 |
| EX-2 As a user, I want a built-in photo editor with advanced filters an... | ▼ | TO DO ▼ | 👤 |
| EX-3 As a user, I want seamless integration with all social media platforms | ⬆ | TO DO ▼ | 👤 |
| EX-4 As a user, I want real-time notifications for all activities on the platform | ⬆ | TO DO ▼ | 👤 |
| EX-5 As a user, I want an AI-powered recommendation engine for per... | ⬆ | TO DO ▼ | 👤 |
| EX-6 As a user, I want offline access to all features and content | ⬆ | TO DO ▼ | 👤 |
| EX-7 As a user, I want the ability to customize every aspect of the application | ⬆ | TO DO ▼ | 👤 |
| EX-8 As a user, I want a built-in video editor with professional-grade features | ⬆ | TO DO ▼ | 👤 |
| EX-9 As a user, I want a comprehensive analytics dashboard with adva... | = | TO DO ▼ | 👤 |
| EX-10 As a user, I want support for multiple languages and localization | ⬆ | TO DO ▼ | 👤 |
| EX-11 As a user, I want a chatbot for instant customer support | ⬆ | TO DO ▼ | 👤 |

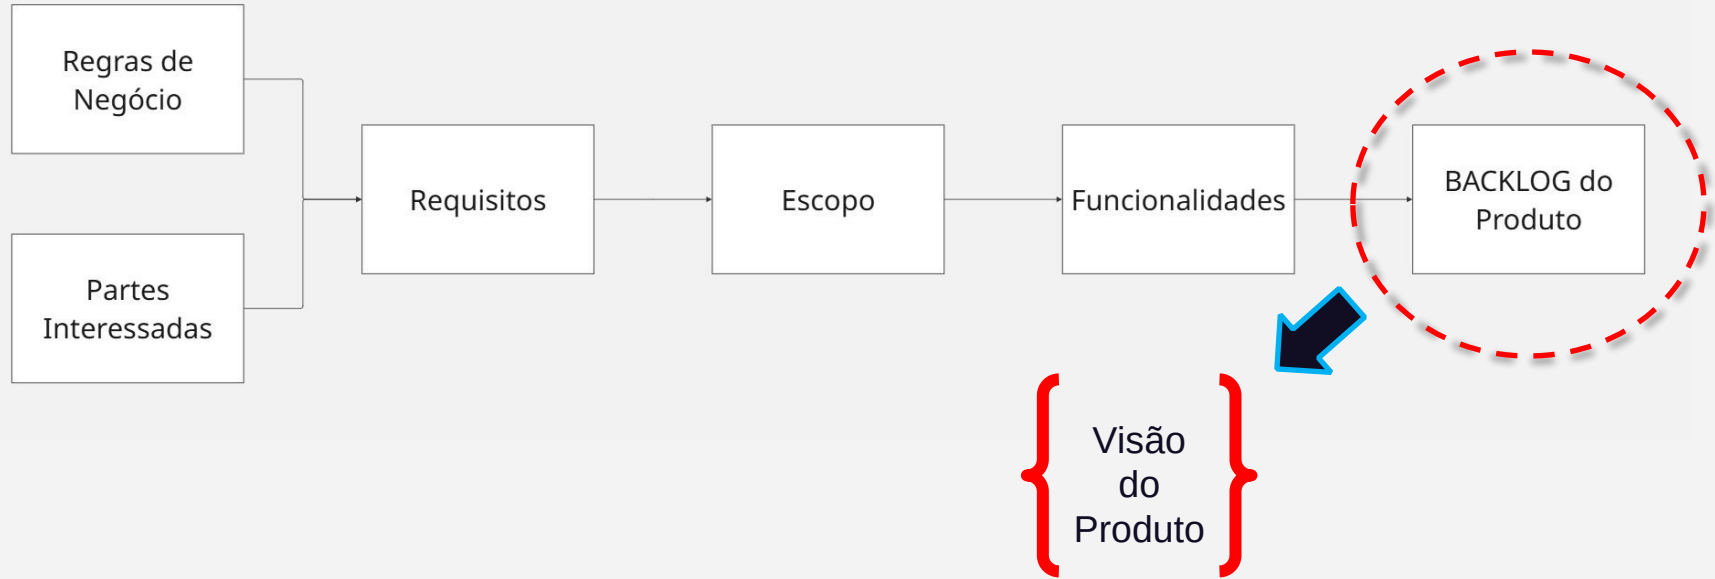

Visão do Produto



cassiano.ricardo@unicesumar.edu.br

► Definição




Uma visão de produto descreve o estado futuro de um produto que uma empresa ou equipe deseja alcançar.

“Não há nada tão **inútil** do que fazer de
forma **eficiente** o que **não deveria**
ser feito”

Peter Drucker

cassiano.ricardo@unicesumar.edu.br

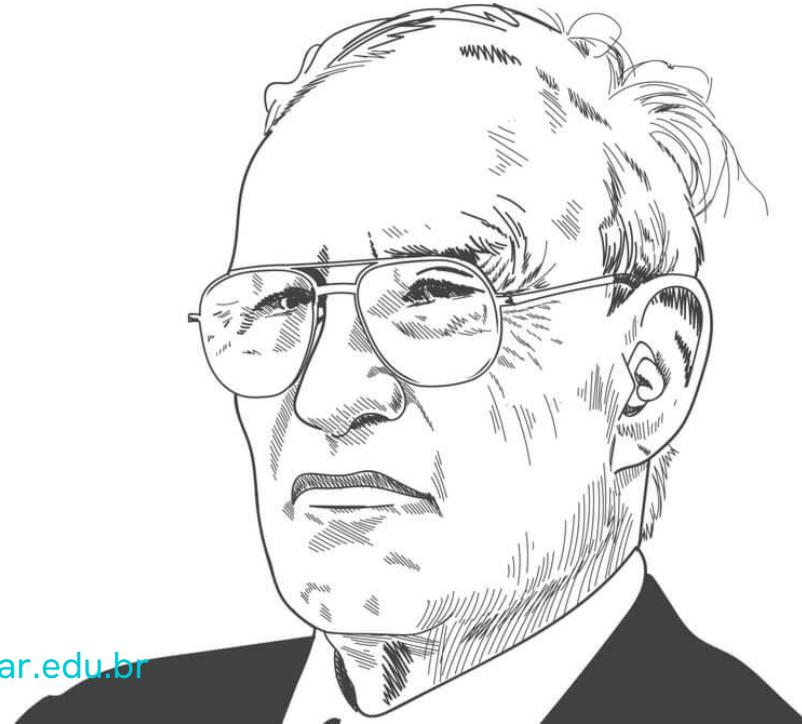

Visão além do alcance



Sumário

Introdução	4
Escopo e Alinhamento Estratégico	4
Definições, Acrônimos e Abreviações	4
Análise de Contexto	4
Detalhamento da Necessidade	4
Descrição do Problema	4
Parte(s) afetada(s)	4
Impacto	4
Solução de Sucesso	5
Alternativas	5
<Alternativa 1>	5
<Alternativa 2>	5
Partes Interessadas	5
Partes Interessadas	5
Detalhamento dos Representantes das Partes Interessadas	6
Usuários	6
Necessidades das Partes Interessadas ou Usuários	7
<Nome da necessidade 01>	7
<Nome da necessidade 02>	7
Objetivos de Negócio	7
Visão Geral do Produto	8
Perspectiva do Produto	8
Características-Chave do Produto	8
Requisitos não Funcionais	9
Suposições e Dependências	9



Partes Interessadas	5
Partes Interessadas	5
Detalhamento dos Representantes das Partes Interessadas	6
Usuários	6
Necessidades das Partes Interessadas ou Usuários	7
<Nome da necessidade 01>	7
<Nome da necessidade 02>	7
Objetivos de Negócio	7
Visão Geral do Produto	8
Perspectiva do Produto	8
Características-Chave do Produto	8
Requisitos não Funcionais	9
Suposições e Dependências	9
Custos	9
Outros Requisitos do Produto	9
Padrões e Normativos Aplicáveis	9
Requisitos da Solução	10
Requisitos de Documentação	10
Restrições	11
Riscos	11
Documentos de Referência	11





DICA!!

Visão do Produto

PARA o cidadão brasileiro

QUE quer dar visibilidade às irregularidades ambientais

O Radar Ambiental

É UM aplicativo mobile de incidentes ambientais

QUE permite registrar ocorrências, ser alertado de novos incidentes, informar à população, dialogar com órgãos públicos, acompanhar e criar ranking das soluções.

≠ DE eCycle, Proteste Já, Dengue Radar

O NOSSO PRODUTO exibe todas as irregularidades sem sorteio ou qualquer avaliação previa, permitindo um acompanhamento de alcance nacional.

► Gestão do Backlog

A gestão do backlog é um trabalho contínuo que requer proatividade e cuidado especial do PO, pois o resultado esperado disso é a entrega de um produto.

Portfolio backlog

Epic

Feature

Product backlog

User Story

Task

Issue tracking

Issue

Configurable

Bug

Task

Test

Test Plan

Test Suite

Test Case

Shared Steps


Shared Parameters



Azure Boards
(Antigo TFS)




(Antigo C. A. Agile Central)

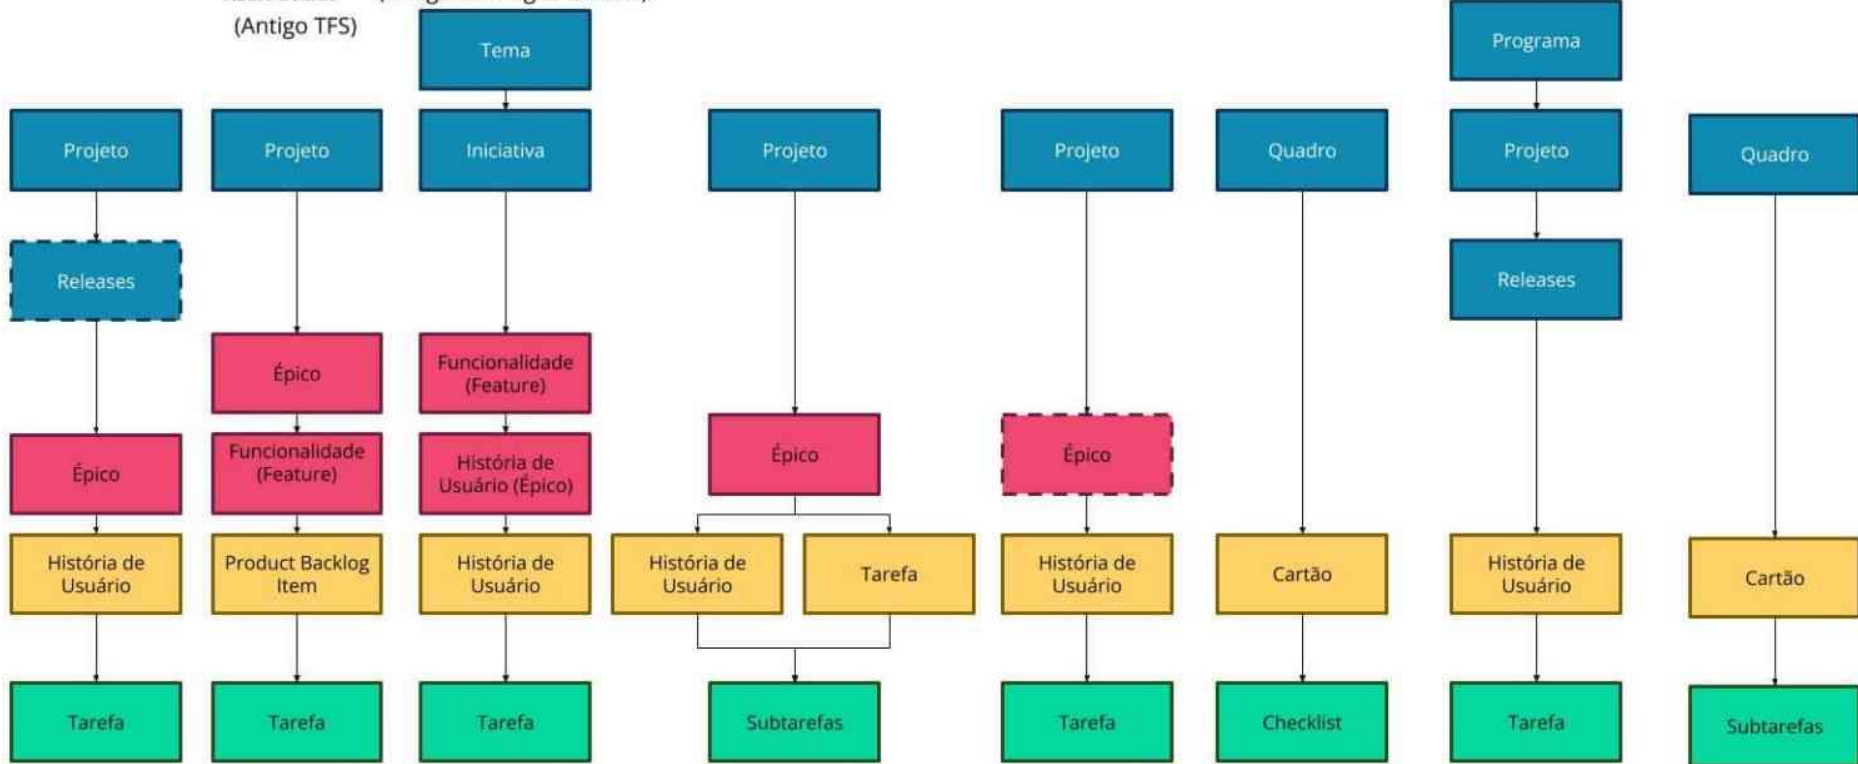



Categoria	Tipo de item de trabalho	Controla listas de pendências/quadros
Épico	Épico	Listas de pendências e quadros de portfólio épicos
Recurso	Recurso	Listas de pendências e quadros de portfólio de recursos
Requisito	História de usuário (Agile) Problema (Básico) Item da lista de pendências do produto (Scrum) Requisito (CMMI)	Quadros e listas de pendências do produto e lista de pendências de sprints
Tarefa	Tarefa	Listas de pendências e quadros de tarefas de sprint
Bug	Bug	Depende da configuração da equipe para rastrear bugs

User Story

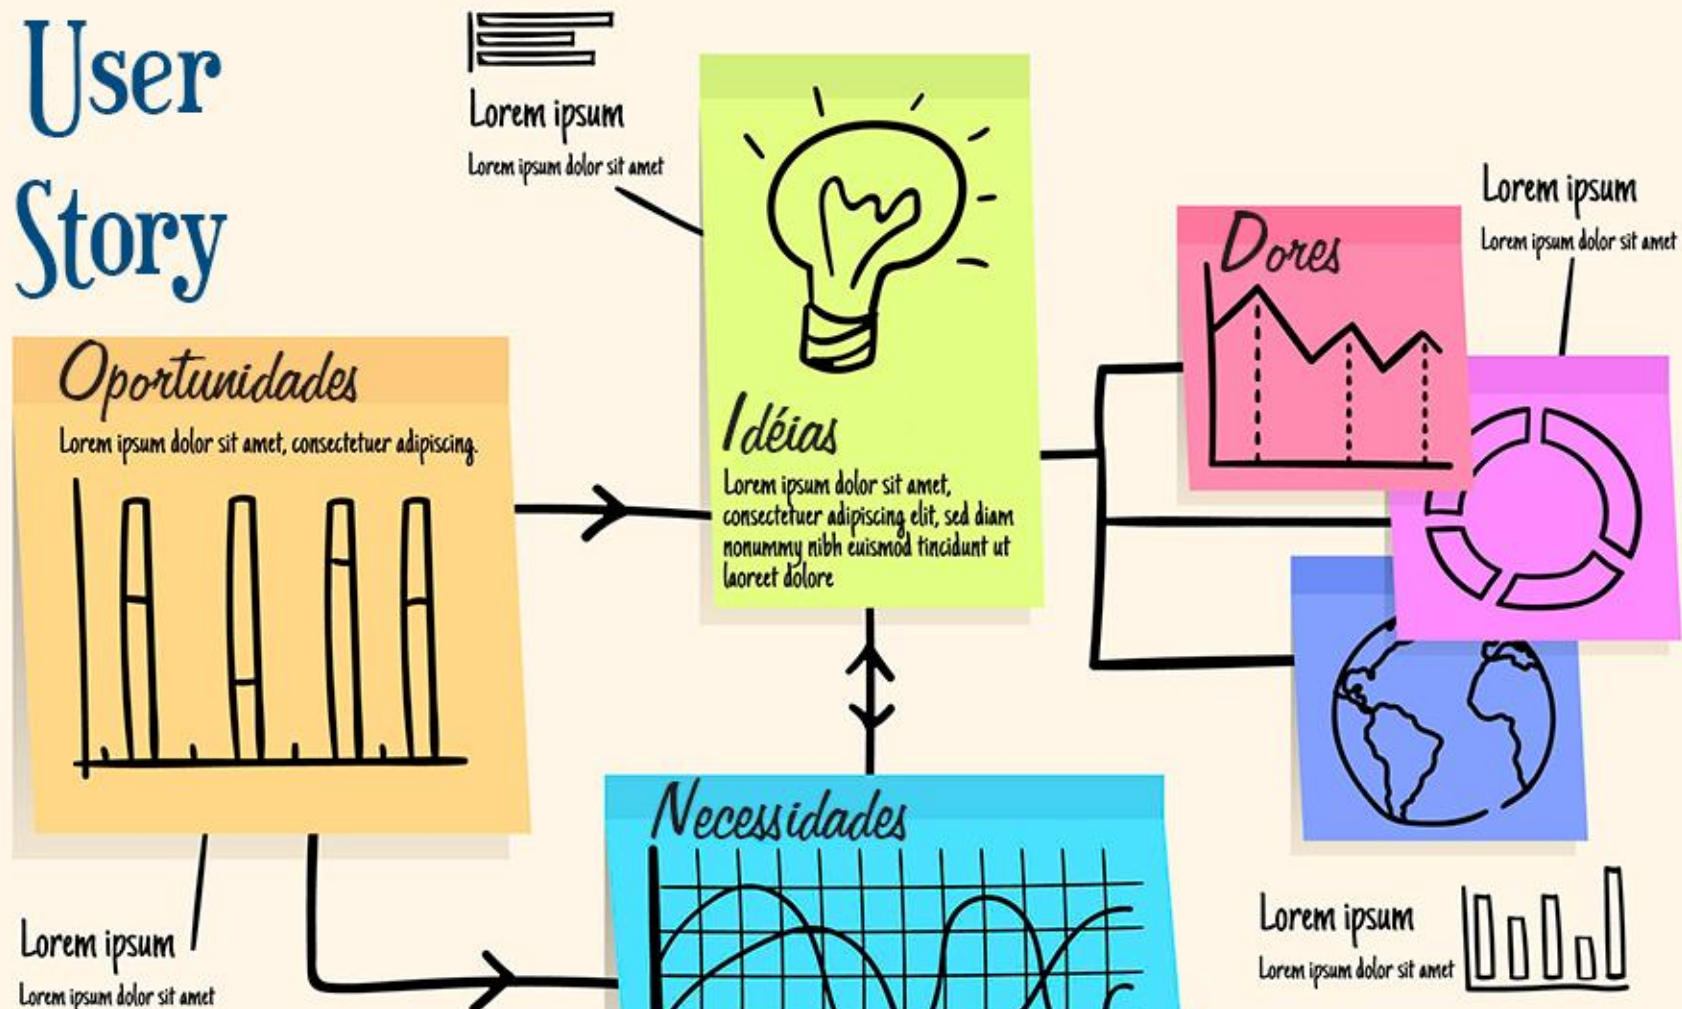

► História de Usuário

Elas possibilitam uma estrutura centrada no usuário para o trabalho diário, o que impulsiona a colaboração, a criatividade e um produto melhor, que entregue valor.

NÚMERO – TÍTULO

Como [persona], eu [quero], [para que].

- Critério de aceite 1
- Critério de aceite 2
- Critério de aceite n...

Como um **Cliente Regular**

Eu quero **salvar itens** na minha lista de desejos

Assim eu posso rapidamente **encontrar e comprar** esses produtos mais tarde

Como um **Assistente de Contas a Receber**

Eu quero **conciliar automaticamente** pagamentos recebidos na conta com as faturas no ERP

Assim eu **minimizo erros e otimizoo tempo** com esse processo

Como um **Gerente de Projetos**

Eu quero **atribuir tickets** aos membros da equipe automaticamente

Assim eu **reduzo trabalho manual** quando se tem alto volume

Descrição:

Como atendente da ouvidoria,

Quero que o sistema inicie a conversa com a pessoa usuária,

Para padronizar e agilizar o atendimento inicial.

Cenário 1: Iniciando atendimento via chat

Dado que a pessoa usuária é a primeira da fila,

e está online no chat

Quando o próximo atendente ficar disponível

e aceitar o atendimento,

Então a conversa deve iniciar

e enviar a mensagem padrão "Olá, eu sou <o/a nome do atendente> e

vou realizar o seu atendimento. Como posso ajudá-lo/a?"

Critérios de aceite

Essa é uma parte fundamental ao escrever as tarefas. Quando listamos os critérios de aceite, estamos definindo o escopo do que será entregue e o que deve ser considerado no desenvolvimento dessa atividade. Portanto, é vital definir muito bem todos os critérios de aceite.

Os critérios de aceite precisam ser claros e objetivos, e além disso devem garantir a qualidade da entrega. Afinal é a partir destes critérios, que iremos alinhar com o time as expectativas dos *stakeholders* envolvidos. Portanto, esse tópico certamente é o mais importante a ser considerado no momento de escrever nossas tarefas.

Além dos pontos citados acima, a definição bem feita dos critérios de aceite contribui para o foco naquilo que deve ser entregue. Ou seja, o time de desenvolvimento sabe exatamente o qual o resultado esperado e investe seu tempo apenas no necessário.

Os critérios de aceite e casos de teste, auxiliam o time de desenvolvimento na validação das atividades.

Descrição:

Como atendente da ouvidoria,

Quero que o sistema inicie a conversa com a pessoa usuária,

Para padronizar e agilizar o atendimento inicial.



Critérios de aceitação:

- A conversa via chat deve iniciar quando uma pessoa atendente ficar disponível e aceitar o atendimento;
- O sistema deve buscar a próxima pessoa usuária da fila, que está online;
- O sistema deve iniciar a conversa entre pessoa atendente e pessoa usuária, enviando a mensagem: "Olá, eu sou <o/a nome do atendente> e vou realizar o seu atendimento. Como posso ajudá-lo/a?".

FORMATO DE HISTÓRIA DE USUÁRIO

Como <papel/perfil>
posso <ação/meta>
para <benefício/razão>

3 W's

QUEM?

O QUÊ?

POR QUÊ?

CRITÉRIOS DE ACEITE

- ☒ Critério para aceitação 1
- ☒ Critério para aceitação 2
- ☒ Critério para aceitação 3

3 C's


CARTÃO

CONVERSA

CONFIRMAÇÃO

I
N
V
E
S
T


**I
N
V
E
S
T**




I	INDEPENDENT (Independente)
N	NEGOTIABLE (Negociável)
V	VALUABLE (Valorosa)
E	ESTIMABLE (Estimável)
S	SMALL (Pequena)
T	TESTABLE (Testável)

► Tarefa

Tarefa, trabalho ou missão em português, e refere-se a uma **atividade específica que precisa ser realizada.**

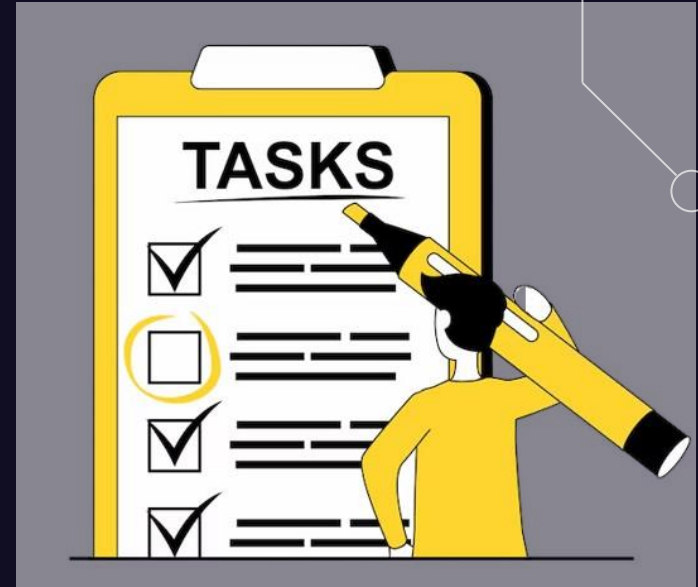

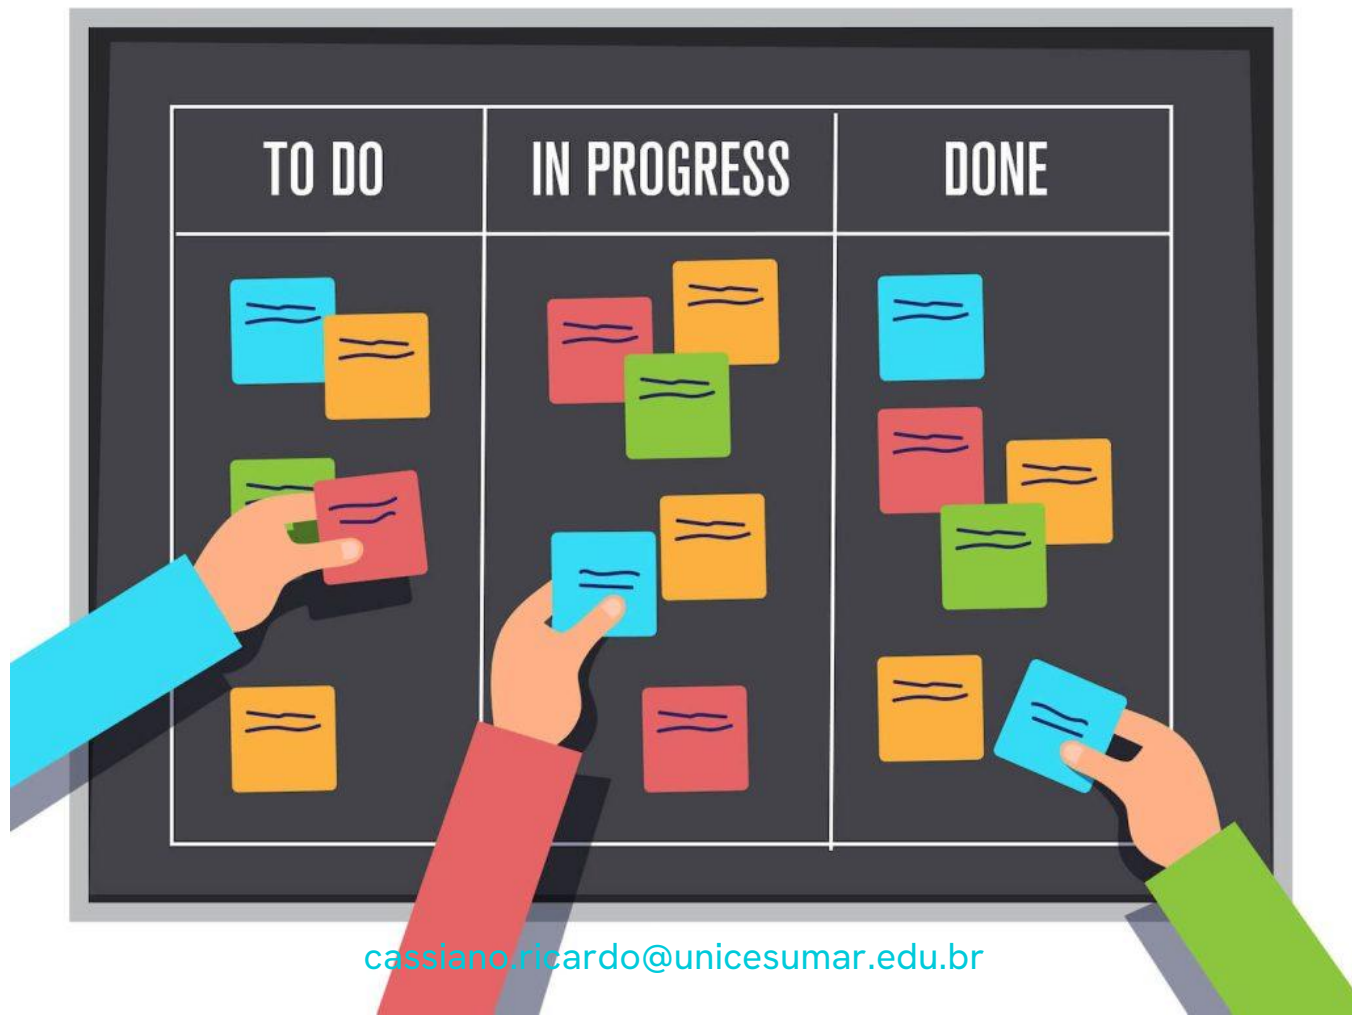

cassiano.ricardo@unicesumar.edu.br

Fabrikam Fiber Team

Taskboard

Backlog

Capacity

+ New Work Item

	 	Order	Assigned To		Remaining Work	Title
	  Task		Jamal Hartnett	...	30	 Hello World Web Site
	 Bug		Christie Church		8	 Design welcome screen
			Jamal Hartnett		4	 Change background color
			Christie Church		12	 About screen
			Jamal Hartnett		6	 Standardize on form
2			Jamal Hartnett		20	 Slow response on information form
			Christie Church		12	 Fix performance issues
			Jamal Hartnett		8	 Standardize
3			Raisa Pokrovskaya		14	 Add an information form

Teams	January	February	March
Service Delivery Backlog items	Sprint 1 1/17 - 2/4 378 Request support Committed Jamal Hartnett 396 Cancel order form Committed Raisa Pokrovskaya 436 Hello World Web Site Done Christie Church 443 Cancel order form Done Raisa Pokrovskaya 1048 Support reset New Jia-hao Tseng 1057 some new item here New Unassigned	Sprint 2 2/7 - 2/25 369 About screen Committed Christie Church 379 Phone sign in Committed Raisa Pokrovskaya 400 Canadian addresses ... Committed Johnnie McLeod 363 Welcome back page Done Johnnie McLeod	Sprint 3 2/28 - 3/18 352 Hello World Web Site Approved Jamal Hartnett 364 Slow response on inf... Committed Jamal Hartnett 366 Hello World Web Site Committed Jamal Hartnett 375 Check service status Done Jamal Hartnett 1069 Permissions Committed Raisa Pokrovskaya 1075 352 : Add an inform... New Helena Petersen


Requisitos em:
► Ambiente Ágil x
Ambiente Tradicional


2


Manifesto Ágil






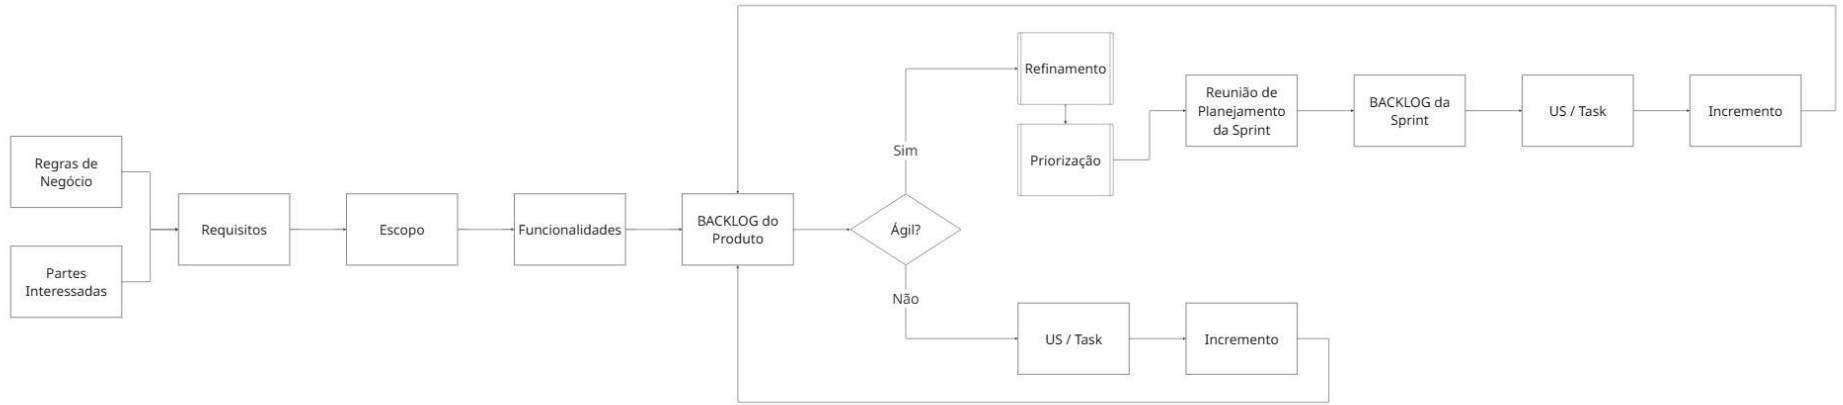


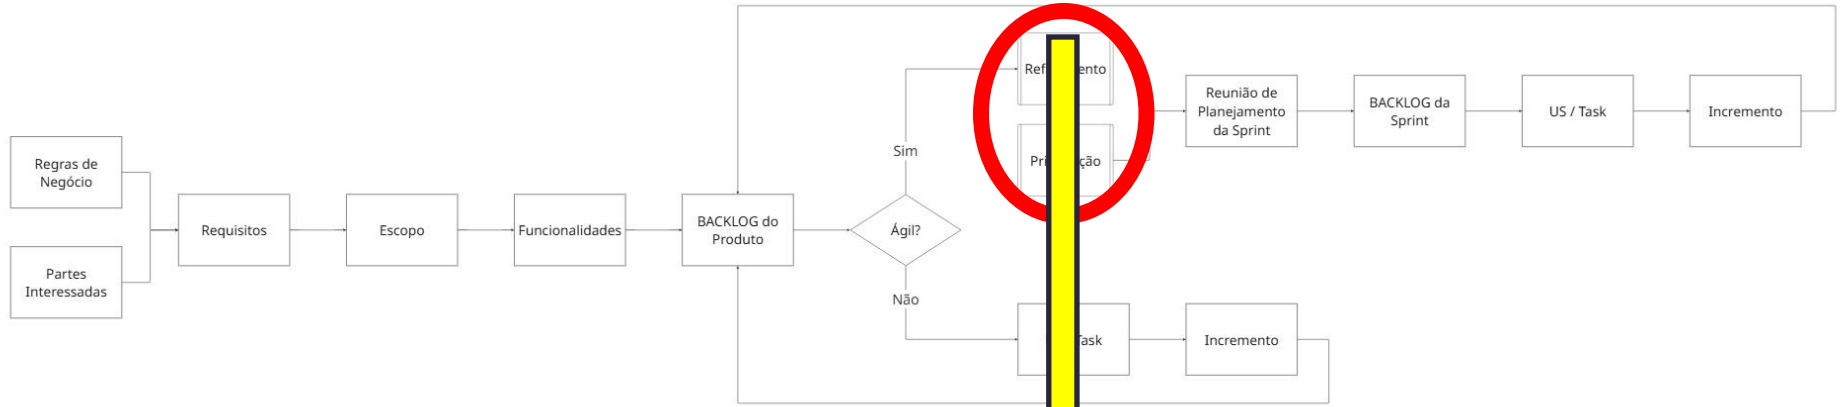

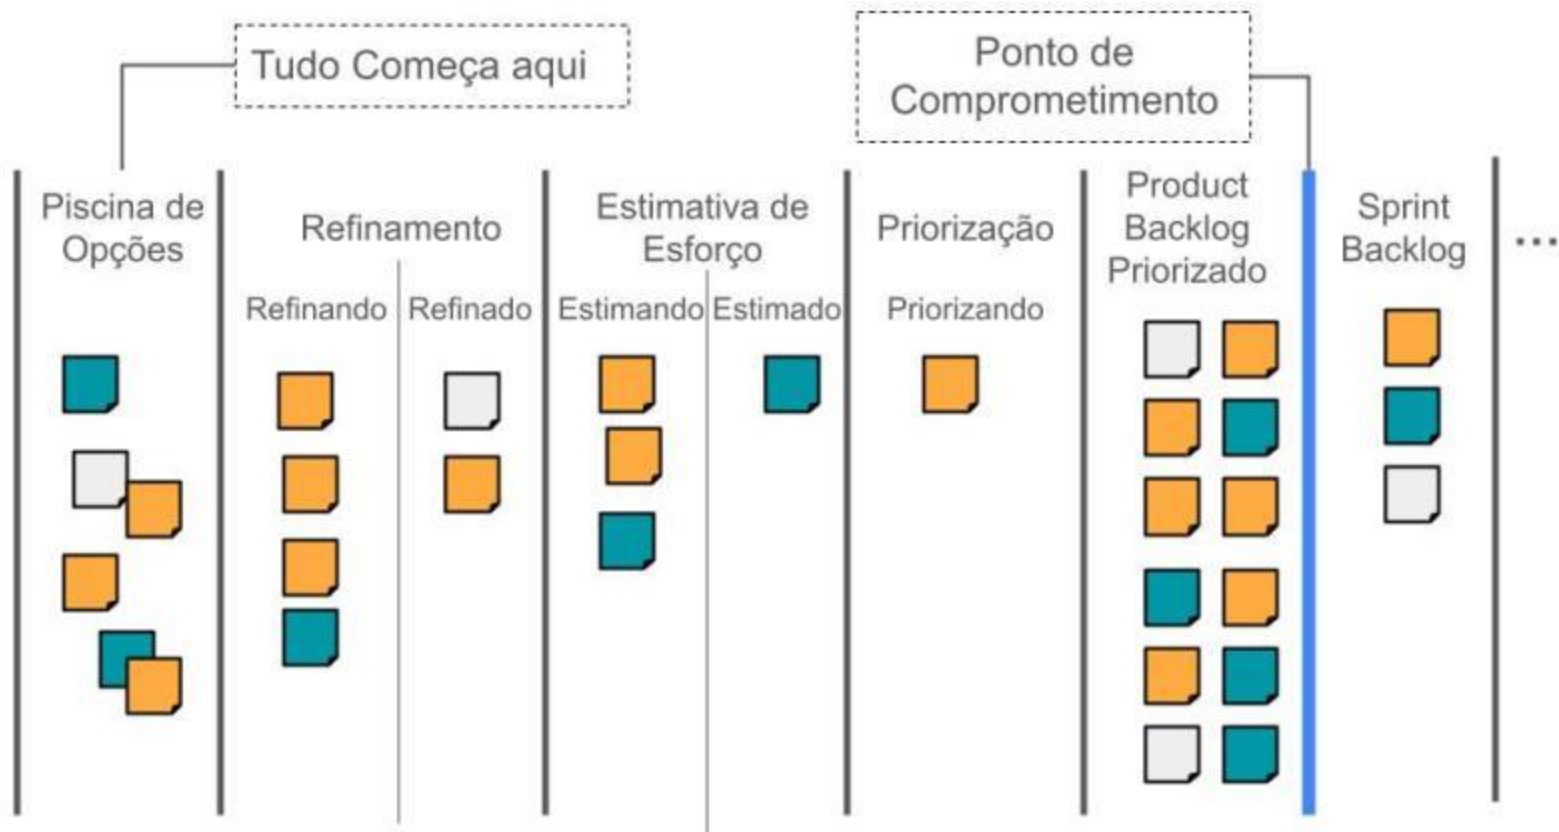

SCRUM FRAMEWORK

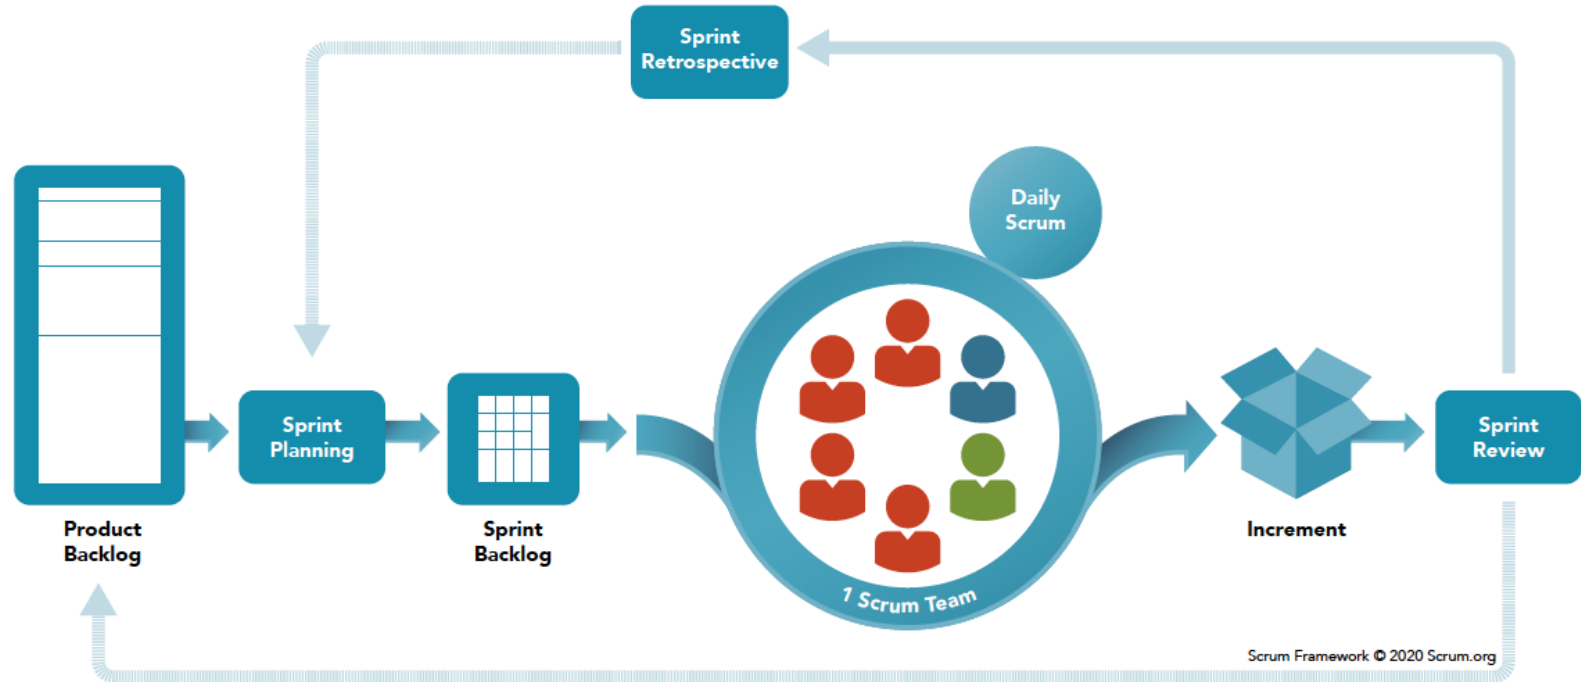

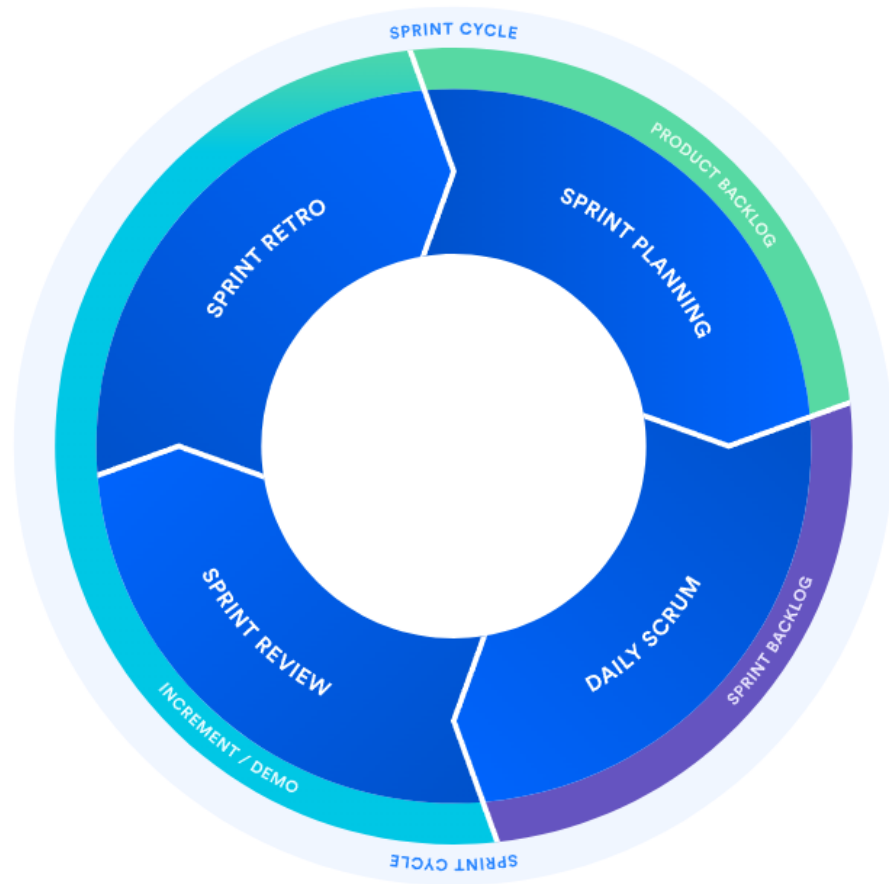

cassiano.ricardo@unicesumar.edu.br

As cerimônias



Planejamento de sprint

Ao fazer uso da prática de Scrum, a reunião de [planejamento do sprint](#) é realizada no início deste, onde as equipes identificam o que pode ser entregue no sprint e como esse trabalho vai ser realizado. No final da reunião de planejamento, cada membro do Scrum precisa esclarecer o que pode ser apresentado no sprint e como o incremento pode ser entregue.

Participantes: equipe de desenvolvimento, scrum master, proprietário do produto

Quando: no início de um sprint.

Duração: em geral, uma hora por semana de iteração. Por exemplo, um sprint de duas semanas começa com uma reunião de planejamento de duas horas.

Estrutura ágil: scrum. (As equipes kanban também planejam, mas não seguem um cronograma de iteração fixo com planejamento de sprint formal)

Finalidade: o planejamento do Sprint prepara toda a equipe para ter êxito durante o sprint. Ao participar da reunião do Scrum, o proprietário do produto vai ter uma lista priorizada de [backlog do produto](#). Eles discutem cada item com a equipe de desenvolvimento e os integrantes do grupo estimam juntos o esforço envolvido. Então, a equipe de desenvolvimento faz uma previsão de sprint que especifica a quantidade de trabalho que consegue concluir da lista de backlog do produto. Essa parte do trabalho se torna a lista de backlog do sprint.



DICA PROFISSIONAL

Use a reunião de planejamento de sprint para analisar as informações do trabalho que precisa ser feito. Incentive os membros da equipe a esboçar as tarefas para todas as histórias, bugs e tarefas de um sprint. Promova discussões e obtenha consenso sobre o plano de ação. O planejamento eficiente proporciona um aumento significativo nas chances de a equipe conseguir atender aos compromissos do sprint.

Reunião rápida diária

A [reunião rápida diária](#) – ou seja, Scrum diário – é uma reunião diária curta de 15 minutos (ou menos) para discutir o progresso e identificar bloqueadores. Os participantes são incentivados a participar em pé para ajudar a manter a reunião curta.

Este é um [template de reunião rápida diária](#) para ajudar sua equipe a começar.

Participantes: equipe de desenvolvimento, mestre Scrum, proprietário do produto

Quando: uma vez por dia, normalmente pela manhã.

Duração: não mais que 15 minutos. Não reserve a sala de conferências para conduzir a [reunião rápida](#) sentado. Ficar em pé faz com que a reunião seja rápida!

Estrutura ágil: scrum e kanban.

Finalidade: a reunião rápida diária é projetada para informar a todos com rapidez o que está acontecendo em toda a equipe. Não é uma reunião de status detalhado. O tom deve ser leve e descontraído, mas informativo. Peça para que cada membro da equipe responda às seguintes perguntas:

- O que fiz ontem?
- No que trabalharei hoje?
- Meu trabalho está com algum obstáculo?

Há uma responsabilidade implícita ao relatar o trabalho concluído no dia anterior na frente dos colegas de trabalho. Ninguém quer ser a pessoa que está sempre fazendo a mesma coisa e não progride.

cassiano.ricardo@unicesumar.edu.br



DICA PROFISSIONAL

Algumas equipes usam cronômetros para que todos mantenham o ritmo. Outras equipes jogam uma bola entre todos para se certificar de que todo mundo está prestando atenção. Muitas equipes distribuídas usam videoconferência ou bate-papo em grupo para lidar com problemas ocasionados pela distância. Sua equipe é única. A reunião rápida também deve ser!

Revisão de sprint

A revisão do sprint, também chamada de revisão de iteração, é onde a equipe do Scrum se reúne para revelar o que foi realizado durante o sprint. Uma equipe de desenvolvimento mostra quais itens de backlog estão “Concluídos” para as partes interessadas e colegas de equipe, que podem então dar feedback.

Participantes: equipe de desenvolvimento, scrum master, proprietário do produto

Quando: no final de um sprint.

Duração: em geral, 45 minutos para cada semana de iteração. Por exemplo, uma retrospectiva de 90 minutos após um sprint de duas semanas.

Estrutura ágil: Scrum e Kanban. Equipes Scrum fazem retrospectivas de sprint com uma frequência fixa. As equipes Kanban também podem se beneficiar de retrospectivas ocasionais.

Finalidade: a revisão do sprint é um momento para mostrar o trabalho da equipe. Elas podem ser feitas de modo casual, como “sextas-feiras de demonstração”, ou com uma estrutura de reunião mais formal de Scrum. Esse é o momento para a equipe celebrar as conquistas, demonstrar o trabalho finalizado na iteração e obter feedback imediato das partes interessadas do projeto. Não se esqueça: deve ser possível demonstrar o trabalho na íntegra e atingir o padrão de qualidade da equipe para ser considerado concluído e pronto para revisão.

Retrospectiva do sprint

Uma [retrospectiva do sprint](#) é uma reunião para analisar o que deu certo durante o sprint e o que pode ser melhorado. As equipes ágeis podem analisar, em particular, a dinâmica, os processos e as ferramentas da equipe e, em seguida, criar planos para melhorar a forma como a equipe trabalha.

Este é um [manual de estratégias da equipe sobre como fazer retrospectivas](#).

Participantes: equipe de desenvolvimento, scrum master, proprietário do produto

Quando: no final de um sprint.

Duração: em geral, 45 minutos para cada semana de iteração. Por exemplo, uma retrospectiva de 90 minutos após um sprint de duas semanas.

Estrutura ágil: Scrum e Kanban. Equipes Scrum fazem retrospectivas de sprint com uma frequência fixa. As equipes Kanban também podem se beneficiar de retrospectivas ocasionais.

Finalidade: ser ágil significa obter feedback rápido para tornar o produto e a cultura de desenvolvimento melhores. As retrospectivas ajudam a equipe a entender o que funcionou bem e o que não funcionou.

As retrospectivas não são apenas um momento para reclamações sem ação. Use retrospectivas para descobrir o que está funcionando para que a equipe possa continuar a focar nessas áreas. Além disso, descubra o que não está funcionando e use esse momento para encontrar soluções criativas e desenvolver um plano de ação. Melhoria contínua é o que sustenta e impulsiona o desenvolvimento dentro de uma equipe ágil, e as retrospectivas são uma parte fundamental disso.



DICA PROFISSIONAL

Mesmo que as coisas estejam indo bem em toda a equipe, não pare de fazer retrospectivas. Elas dão uma orientação contínua para que as coisas continuem funcionando bem.

TEMA

ÉPICO

ÉPICO

ÉPICO

FUNCIONALIDADE

FUNCIONALIDADE

FUNCIONALIDADE

FUNCIONALIDADE

FUNCIONALIDADE

FUNCIONALIDADE

HISTÓRIA DE
✓ USUÁRIO
E
CRITÉRIOS DE
ACEITE

HISTÓRIA DE
✓ USUÁRIO
E
CRITÉRIOS DE
ACEITE

HISTÓRIA DE
✓ USUÁRIO
E
CRITÉRIOS DE
ACEITE

HISTÓRIA DE
✓ USUÁRIO
E
CRITÉRIOS DE
ACEITE

HISTÓRIA DE
✓ USUÁRIO
E
CRITÉRIOS DE
ACEITE

HISTÓRIA DE
USUÁRIO
E
CRITÉRIOS DE
ACEITE

HISTÓRIA DE
USUÁRIO
E
CRITÉRIOS DE
ACEITE

HISTÓRIA DE
USUÁRIO
E
CRITÉRIOS DE
ACEITE

HISTÓRIA DE
USUÁRIO
E
CRITÉRIOS DE
ACEITE

HISTÓRIA DE
USUÁRIO
E
CRITÉRIOS DE
ACEITE

TAREFAS

TAREFAS

TAREFAS

TAREFAS

TAREFAS

TAREFAS

TAREFAS

TAREFAS

TAREFAS

TAREFAS

TAREFAS

TAREFAS

TAREFAS

TAREFAS

TAREFAS

TAREFAS

TAREFAS

TAREFAS

TAREFAS

TAREFAS

VISÃO e META

SOLUÇÃO

REQUISITO detalhado
TÉCNICA INVEST

TRABALHO detalhado
TÉCNICA SMART



cassiano.ricardo@unicesumar.edu.br

Beyond Gravity
Software project

PLANNING

Lunar Rover

Board ▾



Roadmap



Backlog



Active sprint



Reports



Issues



Components

DEVELOPMENT



Code



Security



Releases



Pages



Add shortcut



Project settings

You're in a company-managed project

[Learn more](#)

Projects / Beyond Gravity

Backlog



Epic ▾

Label ▾

Type ▾

Insights

▼ Sprint 3 8 Dec - 19 Dec (8 issues)

3 2 +0

Complete sprint



NUC-344	Optimize experience for mobile web	BILLING	TO DO ▾	2	⋈	
NUC-360	Onboard workout options (OWO)	ACCOUNTS	TO DO ▾	1	⋈	
NUC-337	Multi-dest search UI mobileweb	ACCOUNTS	TO DO ▾	5	⋈	
NUC-339	Billing system integration - frontend	AWS SPIKE	TO DO ▾	3	⋈	
NUC-340	Account settings defaults	ACCOUNTS	TO DO ▾	4	⋈	
NUC-341	Quick payment	FEEDBACK	TO DO ▾	2	⋈	
NUC-342	Fast trip search	ACCOUNTS	TO DO ▾	1	⋈	
NUC-335	Affelite links integration - frontend	BILLING	TO DO ▾	2	⋈	

+ Create issue

▼ Sprint 3 8 Dec - 19 Dec (4 issues)

3 2 +0

Complete sprint



NUC-336	Quick booking for accomodation	FORMS	TO DO ▾	1	⋈	
NUC-346	Adapt web app no new payments	FORMS	TO DO ▾	2	⋈	
NUC-343	Fluid booking on tablets	FEEDBACK	TO DO ▾	3	⋈	
NUC-354	Shopping cart purchasing error	FORMS	TO DO ▾	4	⋈	

AdventureWorks Mobile

Overview

Boards

Work Items

Boards

Backlogs

Sprints

Queries

Plans

Repos

Pipelines

Test Plans

Artifacts

Project settings

FabrikamFiber Board

New

Active

5/5

Staging

15/5

Deployed

3/3

New Item

Hotels filter page

Carlos Slattery

Kanban

Guests page

Carole Poland

Kanban

NFC open door

Cecil Folk

Kanban

Room Tab

Celeste Burton

Kanban (Design)

Map filter

Carole Poland

Kanban

Rooms (List)

Hotel reviews page

Celeste Burton

Kanban (Design)

Home page (selected room)

Kat Larson

Design

Top page controls

Celeste Burton

Kanban

Search component complex features

Cecil Folk

General

Kanban

Images from api

Carole Poland

Kanban

Adapt some parts of UI to UWP for Desktop

Carole Poland

Blocked

Kanban

Home page (no room selected)

Carlos Slattery

Kanban

Entry + validations

Carole Poland

Navigation menu

Carlos Slattery

Kanban

Login page

Celeste Burton

Blocked

Kanban

Ambient settings

Carlos Slattery

Kanban

Notifications list

Carole Poland

General

Mobile (Spike)

Celeste Burton

Design

Footer

Cecil Folk

Kanban

Kanban

Code of Conduct

Celeste Burton

General

Kanban

Add Project	Status	Progress	Dates	Priority	Approval stage	
Event Planning General Asana Templates	● On Track Jul 17	 54%	Jul 2 – Oct 24	High	Changes ...	
Candidate Tracking General Asana Templates	● At Risk Jul 5	 25%	May 28 – Oct 3	Medium	Ready for ...	
Editorial Calendar General Asana Templates	● No status updates, yet	 71%	Jul 26 – Oct 31	Low	Approved	
Campaign Management General Asana Templates	● On Track Jul 5	 38%	May 1 – Oct 31	High	Approved	
Work and Creative Requests General Asana Templates	● On Track Jul 5	 80%	Due Oct 5	Low	Ready for ...	
Team Onboarding Plan General Asana Templates	● Off Track Jul 5	 26%	Aug 26 – Sep 26	Low	Changes ...	



Sprint Plan

- ▶ Hey, Welcome to Sprint Plan Notion template, Inside this toggle you can read how to use this template.
- ▶ Quick Links

Dashboards

-  [Dashboard](#)
-  [My Day](#)
-  [Sprints](#)
-  [Progress](#)

Sprint Management

-  [Sprint Backlog](#)
-  [Task Manager](#)
-  [Sprint Schedule](#)
-  [Archived](#)

Resources

-  [Notes](#)
-  [Goals Hub](#)
-  [Meeting Notes](#)

- ▶ This Runs The Template

Print Planning By [Akshay Raveendran](#) | [Tutorials](#) | [More Free/Paid Notion Templates](#) | [Support Me On X \(Twitter\)](#).

cassiano.ricardo@unicesumar.edu.br



Progress

► Quick Links

Sprint Backlog

Intake Do Next Next Week Scheduled Progress

Aa Name	Product Backlog	Assignee ⓘ	Progress	Sprint Duration	Schedule	Σ Total Effort
New Sprint			● Not started	September 20, 2024		☐ Total Effort Es
New Sprint			● Not started	September 12, 2024		☐ Total Effort Es

Notes

Intake Sprint Recent

Aa Name	Description	Category	Goals	Author	Priority	Created Date
						September 17, 20
						September 17, 20
						September 17, 20

Print Planning By [Akshay Raveendran](#) | [Tutorials](#) | [More Free/Paid Notion Templates](#) | [Support Me On X \(Twitter\)](#).

cassiano.ricardo@unicesumar.edu.br

ClickUp

SPACES

+ NEW SPACE

Everything

SD Agile Scrum Project #1 - 003

Product Backlog Management-003

Product Backlog

Sprint Planning-003

Sprint Planning Meeting - Sprint1

Sprint Planning Meeting - Sprint2

Daily Stand-up Meetings-003

Daily Stand-up Meeting - Sprint1

Daily Stand-up Meeting - Sprint2

Sprint Execution-003

Project #1 Sprint 1

Project #1 Sprint 2

Project #1 Sprint 3

Project #1 Sprint 4

Sprint Review-003

Sprint Review Meeting - Sprint1

Sprint Review Meeting - Sprint2

Sprint Retrospective-003

Sprint Retrospective Meeting - Sprint1

Sprint Retrospective Meeting - Sprint2

Incremental Delivery-003

Shippable Product Increment - Sprint1

Shippable Product Increment - Sprint2

Issue Tracking-003

Sprint Issue Tracking - Sprint1

Sprint Issue Tracking - Sprint2

Sprint Issue Tracking - Sprint3

Product Backlog

List

Board

+ View

Automate (4)

Share

Filter

Group by: None

Subtasks

Me

Assignees

Show

Product Backlog

+ NEW TASK

19 TASKS

User Story 1

must have

ready for beta qa

ready for prod qa

1

User Login Functionality

As a user, I want to be able to log in to the system usin...

Sprint #1

v1.1

P01

UI/UX

Simple

Me

User Story 5

should have

sprint-1

st=2

1

User Profile Update

As a user, I want to be able to update my profile infor...

Sprint #1

v1.0

P02

UI/UX

Simple

L

User Story 7

could have

ready for beta qa

sprint-2

1

Dashboard Redesign

As a user, I want the system's dashboard to be redesigne...

Sprint #2

v2.2

P01

UI/UX

Moderate

Me

User Story 16

could have

ready for beta qa

ready for prod qa

1

User Profile Picture

As a user, I want to upload and manage a profile pictu...

Sprint #2

v2.2

P04

UI/UX

Moderate

H

User Story 20

could have

ready for beta qa

ready for prod qa

1

User Onboarding

As a user, I want an efficient and user-friendly onboard...

Sprint #4

v1.3

P04

UI/UX

Simple

L

User Story 2

ready for beta qa

ready for prod qa

ready for ship

1

Data Export Feature

As an admin, I want to be able to export data from th...

Sprint #1

v1.2

P02

Backend

Moderate

H

User Story 6

backend

must have

ready for beta qa

1

Error Logging

As a system admin, I want the system to log any error...

Sprint #2

v1.3

P04

Backend

Simple

H

User Story 10

backend

could have

ready for beta qa

1

Email Notification

As a user, I want to receive email notifications from the...

Sprint #3

v2.2

P04

Backend

Simple

Me

User Story 9

database

ready for beta qa

ready for prod qa

1

Data Import Feature

As an admin, I want to be able to import data into th...

Sprint #1

v1.1

P02

Database

Moderate

H

User Story 11

could have

database

ready for beta qa

1

User Search Function

As a user, I want to search for other users within the ...

Sprint #1

v1.2

P03

Database

Complex

Me

User Story 17

could have

database

ready for beta qa

1

Role Management

As an admin, I want to have the ability to manage user ...

Sprint #1

v1.1

P01

Database

Simple

Me

User Story 4

could have

integration

ready for beta qa

1

API Integration

As a developer, I want to integrate the system with ex...

Sprint #1

v2.2

P03

Integration

Moderate

Me

User Story 12

integration

must have

ready for beta qa

1

Performance Monitoring

As a system admin, I want to implement monitoring ...

Sprint #2

v1.3

P04

Integration

Moderate

H

User Story 8

integration

must have

ready for beta qa

1

Role-Based Permissions

As an admin, I want to implement role-based permis...

Sprint #4

v2.3

P03

Security

Complex

+ Task

Sprint 1

+ NEW TASK

SHOW CLOSED

PRODUCTION	1 TASK	ASSIGNEE	DUE DATE	PRIORITY	TIME ESTIMATE	FRONT END SCRUM PTS	BACK END SCRUM PTS	TOTAL PTS	CONFIDENCE LE...	PROGRESS	
Refine UI			8/15/19		40h	2	1	2	On track	100%	
+ New task											
STAGED	1 TASK	ASSIGNEE	DUE DATE	PRIORITY	TIME ESTIMATE	FRONT END SCRUM PTS	BACK END SCRUM PTS	TOTAL PTS	CONFIDENCE LE...	PROGRESS	
Improve that feature			8/20/19		16h	3	3	9	On track	0%	
+ New task											
REVIEW	3 TASKS	ASSIGNEE	DUE DATE	PRIORITY	TIME ESTIMATE	FRONT END SCRUM PTS	BACK END SCRUM PTS	TOTAL PTS	CONFIDENCE LE...	PROGRESS	
Quality check the build			8/21/19		4h	1	4	4	Might be la...	0%	
New signup page			8/23/19		16h	2	5	10	Might be la...	0%	
Set up data warehouse			8/8/19		24h	1	1	1	On track	0%	
+ New task											


Sprint 2

+ NEW TASK

SHOW CLOSED

REVIEW	2 TASKS	ASSIGNEE	DUE DATE	PRIORITY	TIME ESTIMATE	FRONT END SCRUM PTS	BACK END SCRUM PTS	TOTAL PTS	CONFIDENCE LE...	PROGRESS	
Refactor some code			8/23/19		5h	2	4	8	On track	0%	
New Feature			8/19/19		8h	3	5	15	On track	0%	
+ New task											
IN PROGRESS	3 TASKS	ASSIGNEE	DUE DATE	PRIORITY	TIME ESTIMATE	FRONT END SCRUM PTS	BACK END SCRUM PTS	TOTAL PTS	CONFIDENCE LE...	PROGRESS	
User story			8/26/19		24h	1	3	3	On track	0%	
Fix 404 error			8/25/19		4h	4	5	20	Late		

+ Task

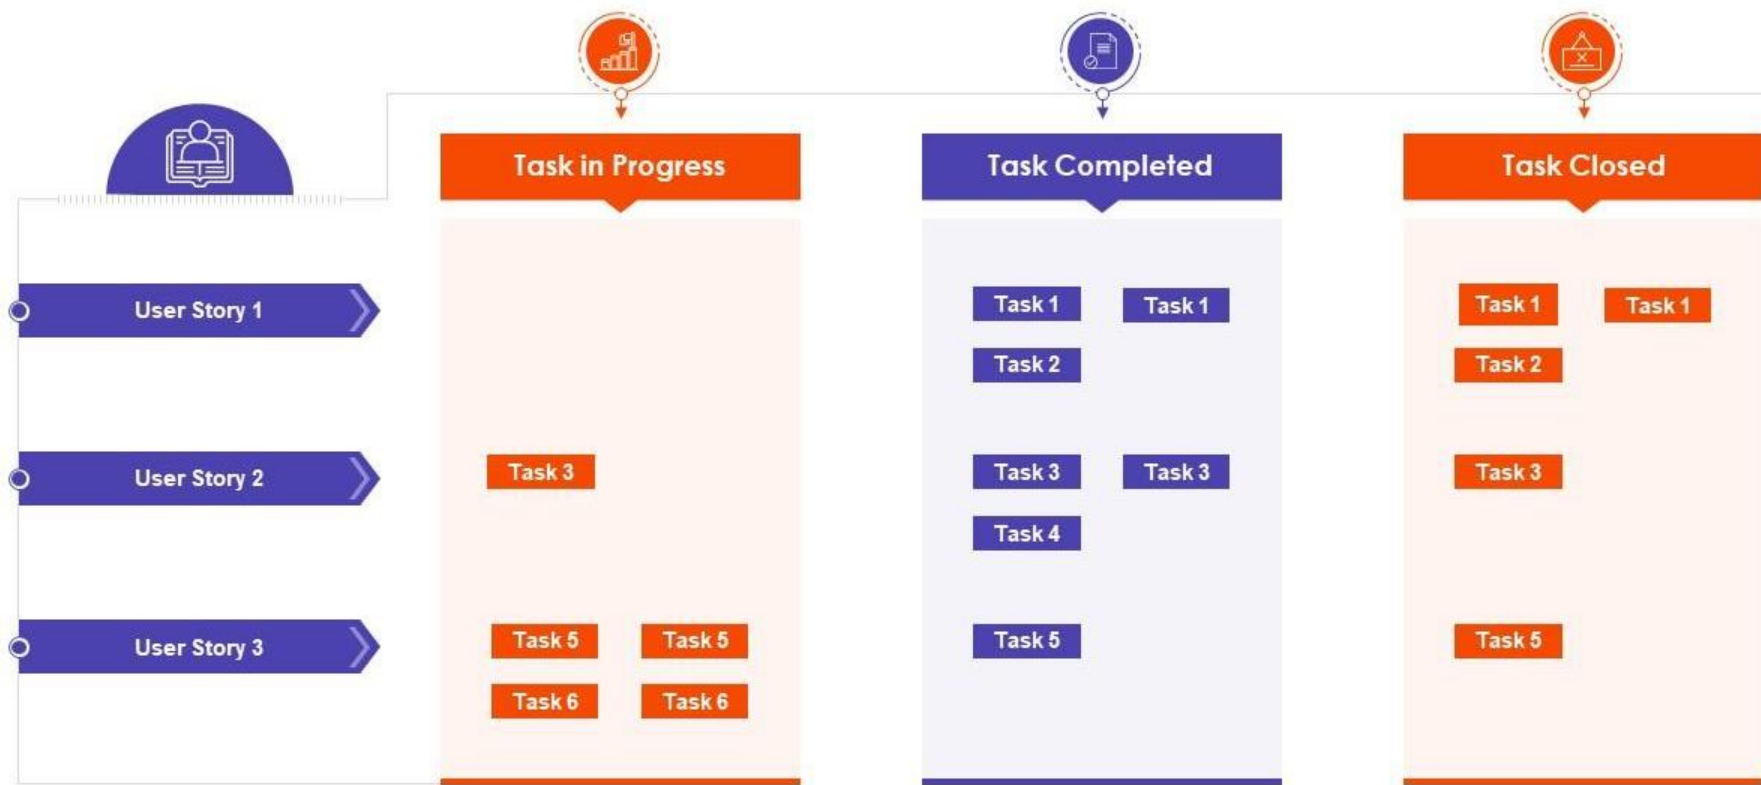

Queries > My Queries > View Agile and Scrum work items ▾ ☆

Results

Editor

Charts

▶ Run query

+ New ▾

💾 Save query

🏷️ Rename

 	ID	Work Item...	Title
	5	Epic	▾ 🏰 Scrum Epic 1
	8	Feature	▾ 🏆 Scrum Epic 1 Feature 1
	14	Product B...	📋 Scrum Epic 1 Feature 1 Backlog item 1
	15	Product B...	📋 Scrum Epic 1 Feature 1 Backlog item 2
	9	Feature	> 🏆 Scrum Epic 1 Feature 2
	6	Epic	> 🏰 Scrum Epic 2
	42	Epic	▾ 🏰 Agile Epic 1
	30	Feature	▾ 🏆 Agile Epic 1 Feature 1
	34	User Story	📋 Agile Epic 1 Feature 1 User story 1
	35	User Story	📋 Agile Epic 1 Feature 1 User story 2
	44	Feature	> 🏆 Agile Epic 1 Feature 2
	45	Epic	> 🏰 Agile Epic 2

A close-up of Yoda's face, looking slightly to the left with a serious expression. He is holding a glowing green lightsaber in his right hand, which is visible on the left side of the frame. The background is a warm, brownish-gold color with some architectural details.

**Como está o cenário
de projetos?**

**Você está
preparado(a)?**

- O mercado de software de gerenciamento de projetos , avaliado em US\$ 6,1 bilhões em 2021, deverá atingir **US\$ 15 bilhões até 2030**.
- Apenas **23%** dos gerentes de projeto utilizam softwares de gerenciamento de projetos para colaboração em equipe, embora isso represente 20% do seu tempo de trabalho.
- **Menos de 50% dos projetos** são concluídos dentro do orçamento na maioria das vezes.

O setor de gerenciamento de projetos está passando por uma grande transformação em 2024. Automação e IA estão substituindo funções manuais e baseadas em planilhas, entre muitas outras mudanças.

Isso exige que os gerentes de projeto estejam atentos e orientem a organização na resposta às oportunidades e ao aumento da carga de trabalho.

Estatísticas de falhas de projetos:

- **70%** das organizações sofreram pelo menos **uma falha de projeto em um ano fiscal**.
- **Entre 65% e 80%** dos projetos de TI não atingem seus objetivos, atrasam ou custam muito mais do que o planejado.
- As empresas **perdem US\$ 109 milhões** para cada **US\$ 1 bilhão investido** em projetos e programas.

- Prevê-se que o software de gestão de projetos cresça a uma **taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 10,67%** e atinja **os 10 mil milhões de dólares** até 2026.
- Segundo o *Project Management Institute* , a economia global precisará **de 87,7 milhões de profissionais de gestão de projetos até 2027** , o que se traduz em **mais vagas** para esses profissionais.
- **A metodologia de gestão de projetos ágil está ganhando popularidade** , e 71% das organizações em todo o mundo a utilizam de alguma forma. Essas estatísticas de gestão de projetos indicam a mudança para uma abordagem adaptativa e **iterativa de gestão de projetos**.
- 46% das organizações listaram **o planejamento adequado de projetos como uma das principais prioridades** para atingir seus objetivos organizacionais.

Estatísticas sobre inovação ágil, segundo [a Bain & Company](#) :

- Quatro em cada cinco entrevistados afirmam que suas organizações preferem a metodologia ágil, pois ela é **1,5 vezes mais eficaz** do que os modelos em cascata e iterativos.
- A adoção do desenvolvimento ágil de software proporcionou uma **melhoria de 41% na previsibilidade** da implantação de software e em sua taxa de sucesso.

Estatísticas de IA em gerenciamento de projetos segundo o PMI :

- **41%** dos especialistas em gestão de projetos relataram uma melhoria significativa na entrega de projetos desde a adoção de **ferramentas e técnicas baseadas em IA para gestão de projetos**.
- Em 2023, **mais de 21% dos gerentes de projeto utilizavam IA** com frequência ou sempre na gestão de projetos.
- Se a aplicação de IA e inovações tecnológicas baseadas em IA pudesse melhorar a taxa de sucesso de projetos em apenas 25%, isso representaria **milhões de dólares** em valor e benefícios para as organizações.

Estatísticas sobre mitigação de riscos em gestão de projetos:

- Embora **27%** das organizações sempre apliquem a gestão de riscos aos seus planos de projeto, **35% fazem-no periodicamente.**


Estatísticas de software de gerenciamento de projetos:

- Apenas 1 em cada 4 organizações utiliza software de gestão de projetos , e **mais de 75%** das organizações não conseguem acompanhar seus KPIs em tempo real.
- Em todas as organizações, **11,4% dos recursos são desperdiçados devido a práticas inadequadas de gestão de projetos.**
- Apenas **15% dos gerentes de projeto se concentram em um único projeto** por vez, enquanto a maioria gerencia vários projetos simultaneamente, alguns deles gerenciando entre **5 e 10 projetos** . É aqui que o software de gerenciamento de projetos pode fornecer uma visão geral de todos os projetos em que estão trabalhando.
- Mais de **53% dos gerentes de projeto estão insatisfeitos** com a tecnologia de gerenciamento de projetos que utilizam.



That's all folks!!

Obrigado!

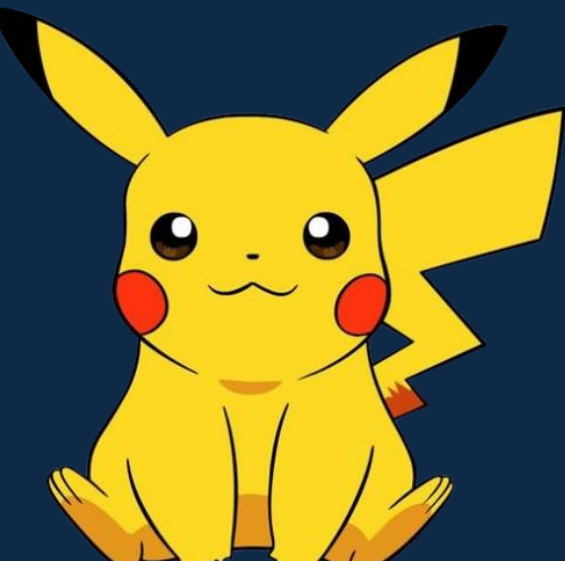

Fico à disposição de vocês!

cassiano.ricardo@unicesumar.edu.br
